


平成 28 年熊本地震により発生した災害廃棄物処理の進捗状況

平成 28 年熊本地震により熊本県内において発生した災害廃棄物の処理について、進捗状況は以下のとおり。

(1) 災害廃棄物の処理状況

平成 29 年 9 月末時点

	廃棄物発生推計量 (A)	処理量 (B=C+D)		再生利用率	処理進捗率	
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)	(C÷B)	(B÷A)
H28年4月～H29年9月	289万t	256万t	189万t	67万t	74%	89%
～H29年8月		243万t	178万t	65万t	73%	84%
～H29年7月		231万t	165万t	66万t	71%	80%
～H29年6月		217万t	155万t	63万t	71%	75%
～H29年5月		202万t	143万t	59万t	71%	70%
～H29年4月		179万t	127万t	52万t	71%	62%
～H29年3月		158万t	111万t	47万t	70%	55%
～H29年2月		140万t	98万t	43万t	70%	48%
～H29年1月		123万t	84万t	40万t	68%	43%
～H28年12月		107万t	71万t	36万t	66%	37%
～H28年11月		89万t	57万t	32万t	64%	31%

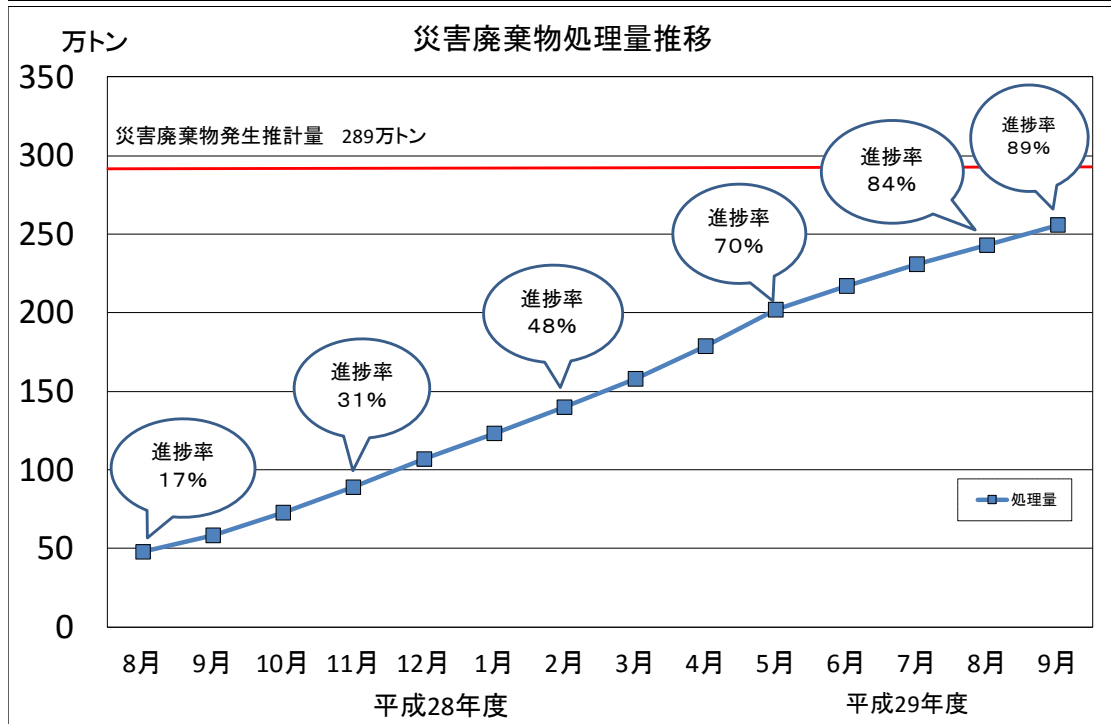


※平成 28 年 12 月から 29 年 5 月まで公表した災害廃棄物発生推計量は災害等廃棄物処理事業費の査定に当たり市町村が推計した災害廃棄物発生量を合計した 316 万トンでしたが、熊本県災害廃棄物処理実行計画第 2 版（平成 29 年 6 月）に基づき 289 万トンに修正しています。

※10 月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。

(2) 損壊家屋等の公費解体の状況

平成29年10月末時点

	申請棟数 (A)	解体済棟数 (B)	解体進捗率 (B/A)
H28年7月～H29年10月	35,754棟	32,469棟	91%
～H29年9月	35,574棟	30,985棟	87%
～H29年8月	35,366棟	29,501棟	83%
～H29年7月	35,184棟	27,848棟	79%
～H29年6月	34,851棟	26,116棟	75%
～H29年5月	34,456棟	23,864棟	69%
～H29年4月	34,178棟	22,245棟	65%
～H29年3月	33,554棟	20,799棟	62%
～H29年2月	31,405棟	17,358棟	55%
～H29年1月	29,838棟	14,774棟	50%
～H28年12月	26,393棟	11,857棟	45%
～H28年11月	23,833棟	8,684棟	36%

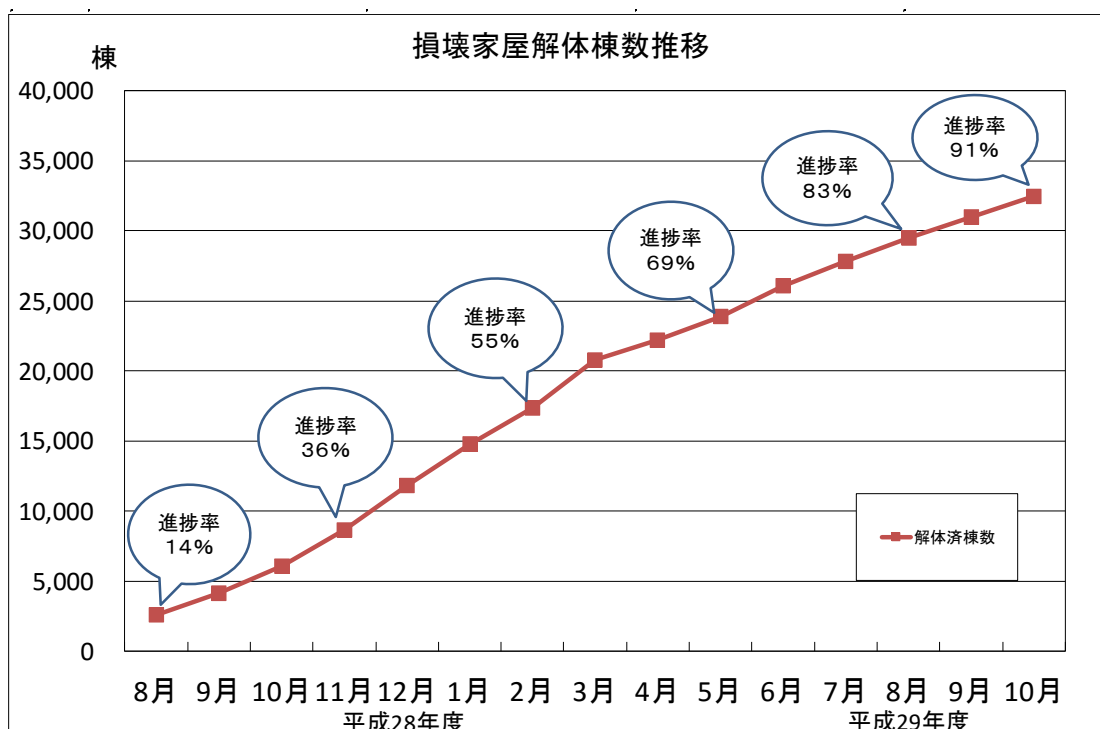

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

※10月に公表した数値についても精査し、一部変更しています。

【連絡先】

環境省環境再生・資源循環局
環境再生事業担当参事官付
災害廃棄物対策室

代表 03-3581-3351、直通 03-5521-8358

対策官：小岩 真之（内線 7853）

課長補佐：荒井 昌典（内線 6870）

係長：切川 卓也（内線 6825）
